工事名	東北福祉大学国見キャンパス及び北山キャンパス施設整備計画 【体育館棟】					2026年 7月・8月 月間工程					
建築主	学校法人 栴檀学園	設計者	株式会社 安井建築設計事務所	監理者	株式会社 安井建築設計事務所	施工者	西松建設・深松組共同企業体	工事場所	宮城県仙台市青葉区北山三丁目	工期	2026/6/8 ～ 2028/2/28

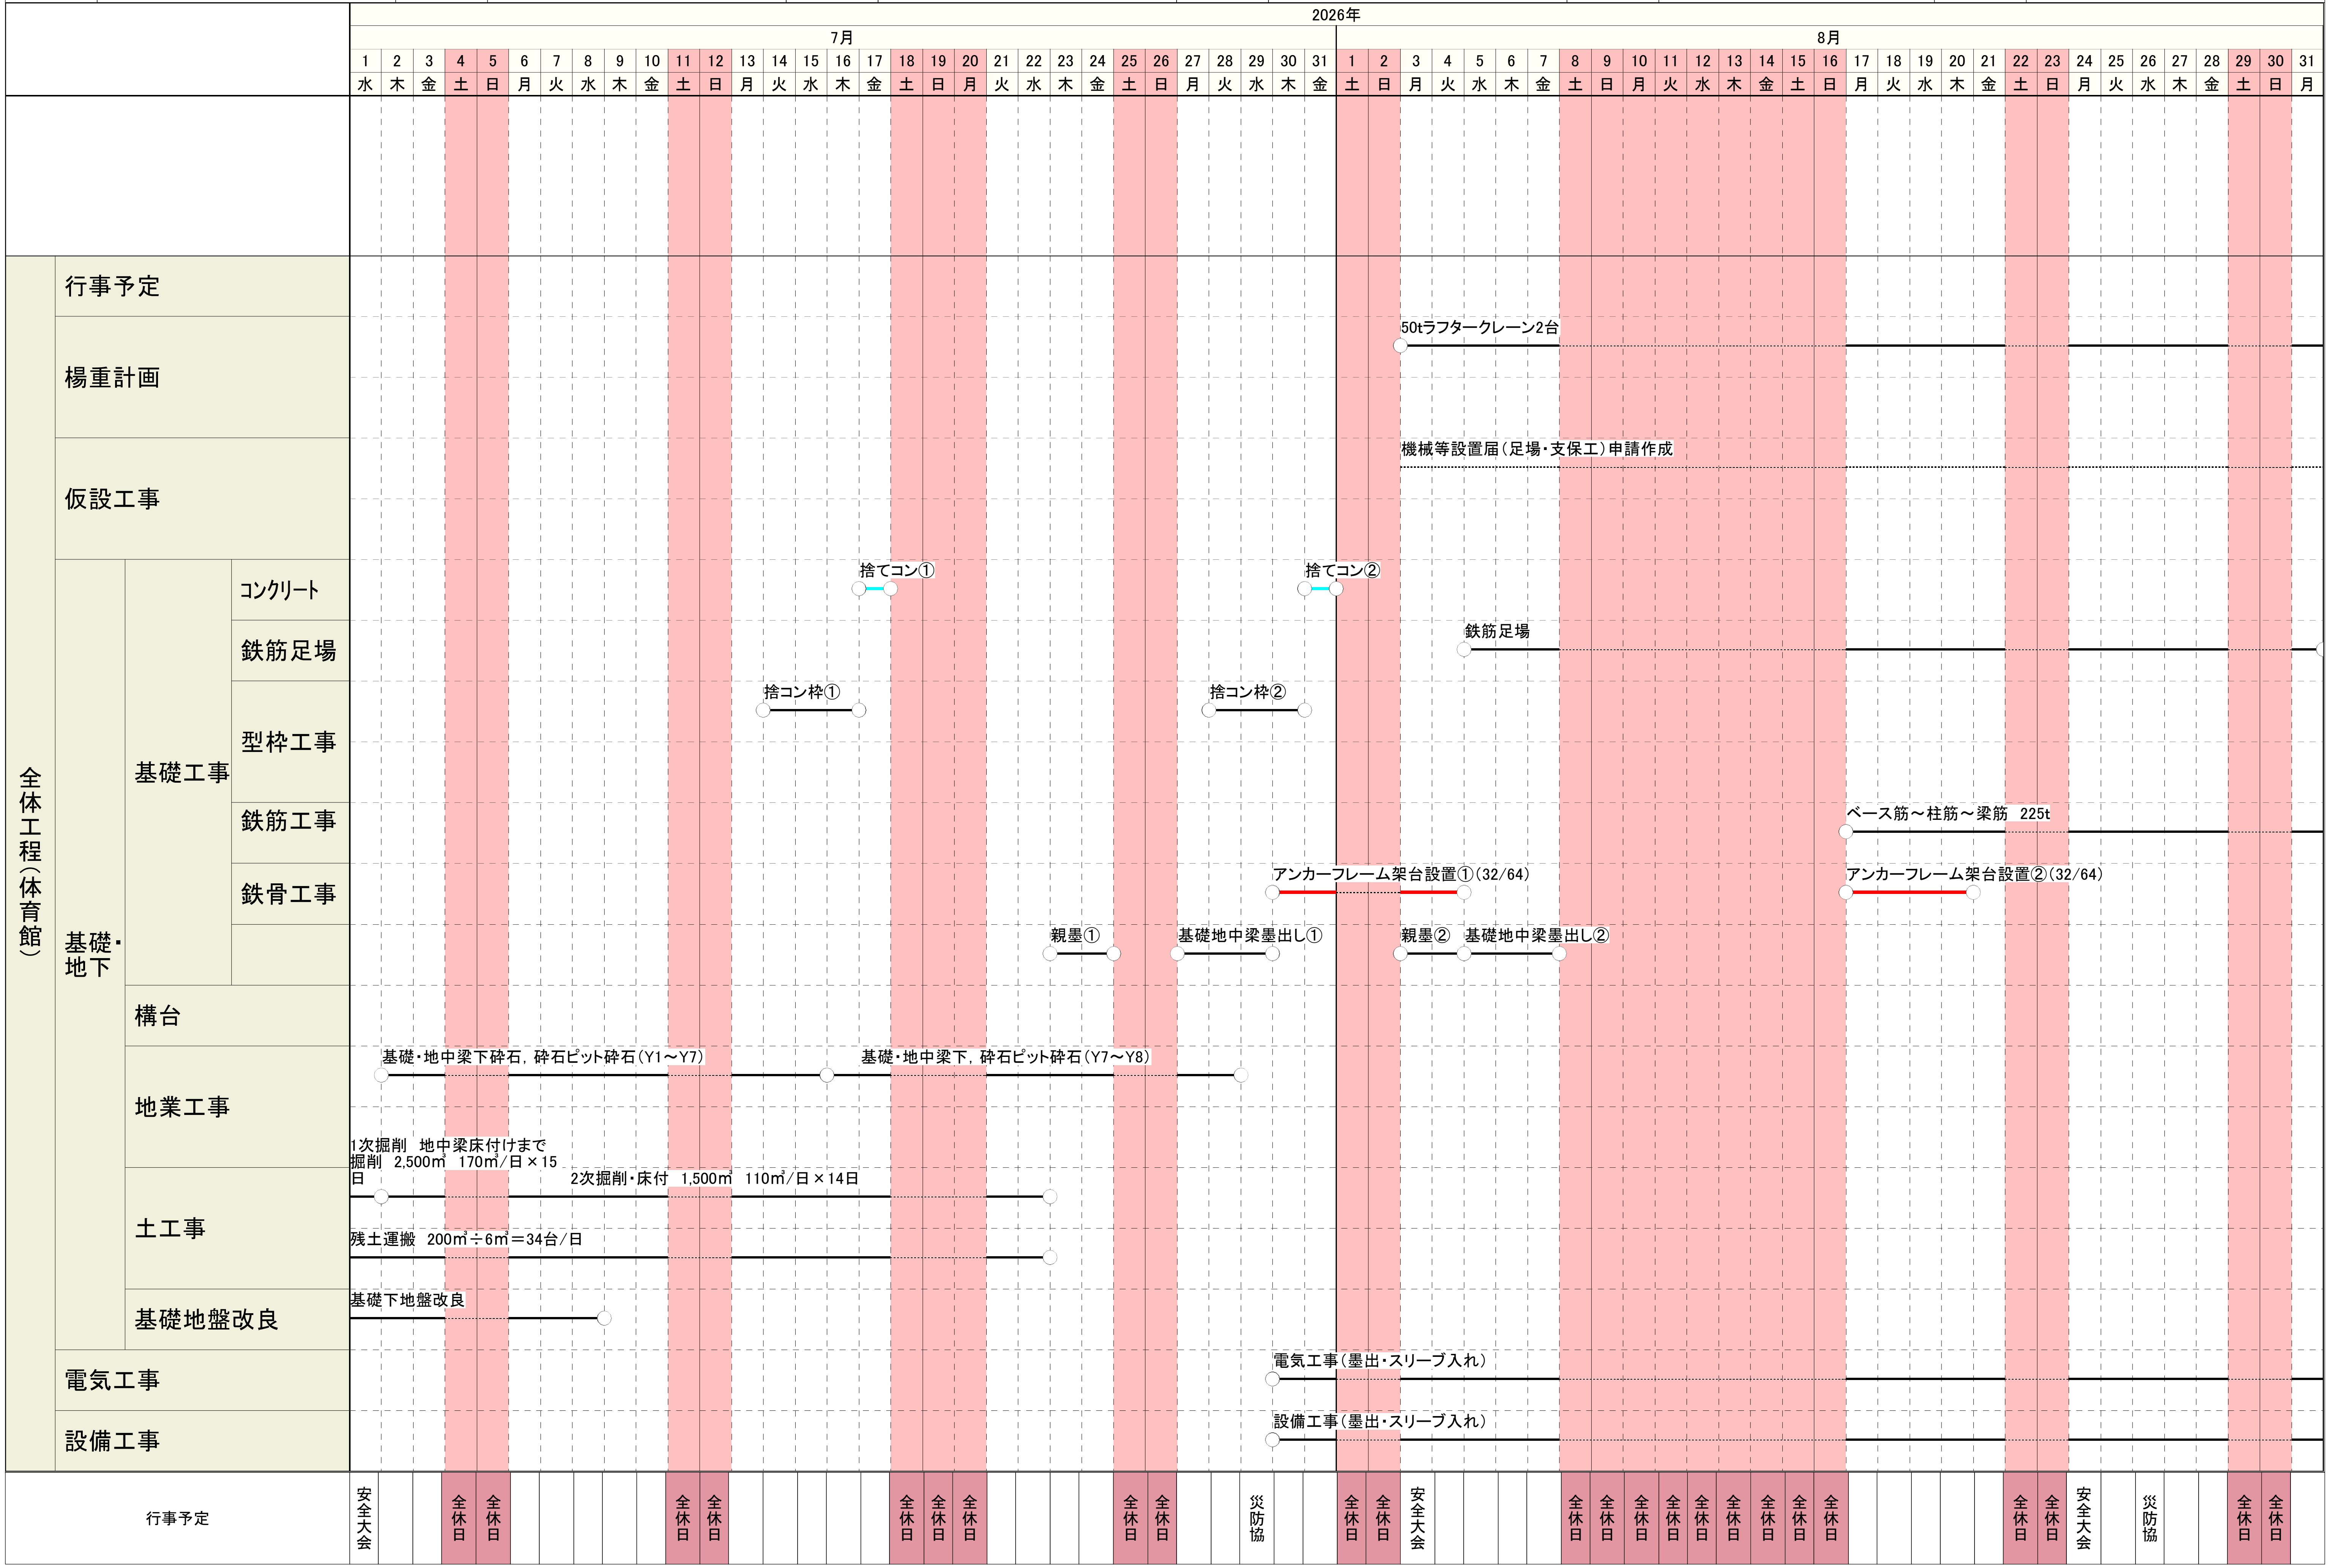
2026年
7月
8月
1 水, 2 木, 3 金, 4 土, 5 日, 6 月, 7 火, 8 水, 9 木, 10 金, 11 土, 12 日, 13 月, 14 火, 15 水, 16 木, 17 金, 18 土, 19 日, 20 月, 21 火, 22 水, 23 木, 24 金, 25 土, 26 日, 27 月, 28 火, 29 水, 30 木, 31 金
1 土, 2 日, 3 月, 4 火, 5 水, 6 木, 7 金, 8 土, 9 日, 10 月, 11 火, 12 水, 13 木, 14 金, 15 土, 16 日, 17 月, 18 火, 19 水, 20 木, 21 金, 22 土, 23 日, 24 月, 25 火, 26 水, 27 木, 28 金, 29 土, 30 日, 31 月
全体工程（体育館）
行事予定
揚重計画
50tラフタークレーン2台
仮設工事
機械等設置届（足場・支保工）申請作成
基礎・地下
基礎工事
コンクリート
捨てコン①
捨てコン②
鉄筋足場
鉄筋足場
型枠工事
捨コン枠①
捨コン枠②
鉄筋工事
ベース筋～柱筋～梁筋 225t
鉄骨工事
アンカーフレーム架台設置①(32/64)
アンカーフレーム架台設置②(32/64)
親墨①
基礎地中梁墨出し①
親墨②
基礎地中梁墨出し②
構台
地業工事
基礎・地中梁下砕石，砕石ピット砕石（Y1～Y7）
基礎・地中梁下，砕石ピット砕石（Y7～Y8）
土工事
1次掘削 地中梁床付けまで
掘削 2,500㎥ 170㎥／日×15日
2次掘削・床付 1,500㎥ 110㎥／日×14日
残土運搬 200㎥÷6㎥＝34台／日
基礎地盤改良
基礎下地盤改良
電気工事
電気工事（墨出・スリーブ入れ）
設備工事
設備工事（墨出・スリーブ入れ）
行事予定
安全大会
全休日
災防協
